
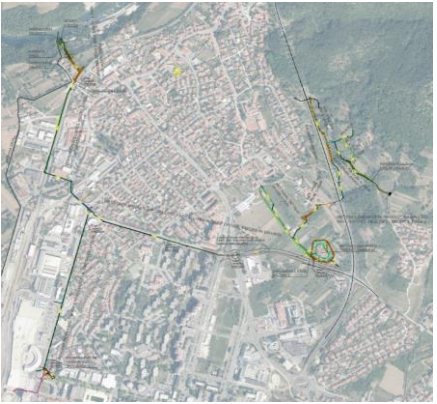


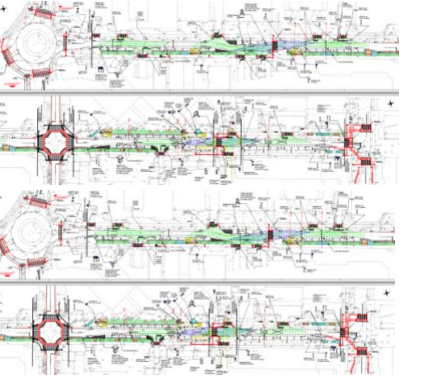


INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR




Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
1	06008	Vzdrževanje objektov v lasti občine	377.700,00 €	216.218,78 €	80,3%	<p>Predvidena je zamenjava dotrajanih instalacij, sanacija prostorov zaradi poplavljenih delov objekta in preureditev notranjih prostorov za namen novih uporabnikov.</p> <p>Sklenjena je pogodba s projektantom za preureditev notranjih prostorov, zaključek projektiranja je predviden v prvi polovici septembra 2023, sledi objava javnega naročila za izvedbo in pričetek izvedbe del v letu 2023, zaključek v začetku leta 2024, kar je skladno s predvideno porabo proračunskih sredstev v teh letih. Za izvedbo rekonstrukcije instalacijskih vodov je bil objavljen razpis, na katerega pa se ni prijavil noben izvajalec, razpis bomo ponovili. Potrebno je pridobiti upravjalca in skleniti pogodbo o upravljanju.</p>	
2	07109	Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti	130.000,00 €	2.049,00 €	94,3%	<p>Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo vežice s spremljajočimi ureditvami je izdelal studio Kozorog v novembru 2018. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 16.3.2020 po izpolnitvi pogoja za izdajo soglasja DDC (izvedba projekta varne poti v Solo). Projekt smo usklajeno v sodelovanju s projektantom in KS Branik nekoliko racionalizirali in prilagodili novim potrebam pogrebne dejavnosti. Objekt smo ocenili na skupno vrednost z DDV 250 000 EUR. Izveden je bil javni razpis za izvedbo. Prispela je zgolj ena ponudba v vrednosti 344.833,76 € vključno z DDV. Postopek smo prekinili, ponudbo zavrnili in smiselno razdeli izvajanje v dve fazi. Iz popisa 1. FAZE smo izpustili ureditev nadstrešnic in predvideno kamnito ploščad na južni strani pokopališča kjer je obstoječa asfaltna površina. Izveden je bil razpis za prvo fazo in ponovno smo prejeli samo eno ponudbo in to v vrednosti 229.510,22 € vključno z DDV. Uspešna primopredaja mora biti izvedena v 145 dneh po uvedbi v delo. Pogodba bo podpisana do 7.9.2023. Smo v fazi zbiranja ponudb za izvedbo obračunsko tehničnega nadzora. Uskladiti bo potrebno še drugo fazo izvedbe, ki bo predvidoma sledila Prvi fazi in bo predvidoma zaključena v prvem poletju leta 2024.</p>	
3	07199	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo	235.000,00 €	0,00 €	63,8%	<p>Projektiranje linije vročevoda DN200 po Rejčevi ulici v Novi Gorici (šolski center in bazen) vključno s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in izvedbo cevovoda. Projektiranje toplovodnega priključka za pokriti bazen.</p>	
4	07272	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	100.000,00 €	65.221,20 €	100,0%	<p>Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za objekt: »Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – odvodnik v Sočo« z vsemi pripadajočimi tehničnimi rešitvami (»Zadrževalni Ščedne« z odvodnim kanalom »BCs« itd.). Projektna dokumentacija se izdeluje za investitorja DRSV na podlagi podpisanega sporazuma o skupni investiciji med MONG in DRSV.</p> <p>V izdelavi je dokumentacije za štiri faze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izgradnja »odvodnika Soča« po Prvomajski Ulici 2. Izgradnja drugega dela »odvodnika Soča« z izpustom v Sočo 3. Izgradnja odvodnega kanala »BCs« po Lavričevi ulici 4. Izgradnja »Zadrževalnika Ščedne« s pripadajočimi tehničnimi rešitvami <p>Dokumentacija je pripravljena, potrebna je še pridobitev parcel in vložiti za mnenja.</p>	
5	07284	LAS - Hiša aleksandrink	171.708,00 €	0,00 €	91,6%	<p>Izvajalec je izbran, dela na objektu se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo in terminskim planom.</p>	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR


Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
6	07300	Projekt VIPava	750.012,00 €	35.983,28 €	95,9%	<p>Projekt VIPava je projekt sofinanciran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave SI3000226 in Vipavski rob SI5000021. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Saksida oziroma Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena krožna tematska pot ob Vipavi.</p> <p>Izvedba del je v teku. Trenutno se izvajajo trije betonski oporniki, na katere se postavi kovinska konstrukcija. Montaža konstrukcije je planirana za drugo polovico septembra 2023. Ob ugodnih vremenskih razmerah (vodostaj reke Vipave) se bodo gradbena dela zaključila v roku. Najverjetneje pa bo zamik pri izvedbi tehničnega pregleda in pridobitvi uporabnega dovoljenja, vendar ne dalj kot do konca leta 2023.</p>	
7	07301	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	3.196.408,00 €	556.251,21 €	87,7%	<p><u>Ureditev manjkajočih odsekov kolesarskih povezav med Delpinovo ulico in vadbena jaso Panovec – sklop A1 (odsek podaljšek Delpinova).</u> Namen in cilje je povezati obnovljeno Delpinovo ulico z novo kolesarsko potjo ob Kormu. Gre za ureditev varne kolesarske povezave od Delpinove ulice do južne kolesarske poti ob Kormu, preko rekonstruiranega križišča med Delpinovo in Trubarjevo ulico ter ureditev nove javne razsvetljave. Izvajajo se dela na komunalni infrastrukturi, ki bodo zaključena v roku 10-14 dni potem sledijo dela na voziščni konstrukciji (robniki, asfalt, oprema ceste, označbe na vozišču, postavitve JR ipd.) Predvidoma se bo rok podaljšal za dobrih 14 dni zaradi pomanjkljive in nejasne projektne dokumentacije (projektanti so bili zaradi dopustov neodzivni).</p> <p><u>Ureditev kolesarskega prometa po Reičevi ulici</u> Z rekonstrukcijo Reičeve ulice se bodo celostno in na sodoben način uredile kolesarske površine v mestu. Z ureditvijo kolesarskega prometa po Reičevi ulici se bo zaključilo urejanje povezovalnega kolesarskega omrežja Nove Gorice. Glavne aktivnosti so ureditev kolesarskih pasov na cestišču, postavitve nove urbane opreme ter postavitve taktilnih oznak. Izdelan je bil elaborat za zaporo po fazah, predana bančna garancija in izvajalec je bil uveden v delo, ki bo z deli pričel 25.8.2025. Če ne bo nepredvidenih dogodkov bo izvajalec dela zaključil v pogodbenem roku t.j. do 8.12.2023.</p>	 







INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR

Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
						<p><u>Cankarjeva ulica</u></p> <p>Namen projekta je zmanjšati avtomobiliziran promet in s tem poskrbeti za zmanjšanje izpustov CO2, torej prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog. Cilj je na območju mesta Nova Gorica zgraditi, rekonstruirati in vzpostaviti povezano kolesarsko omrežje vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta ter vzpostaviti centra trajnostne mobilnosti. S tem se želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in povečati uporabo koles kot obliko dnevne mobilnosti. V okviru projekta je predvidena izvedba več odsekov kolesarskih povezav, med njimi tudi Cankarjeva ulica. Poleg izgradnje kolesarske in peš poti na Cankarjevi ulici, je bil na odseku od Erjavčeve ulice do priključka ob Kemometalu (prečni profili P1-P24) zgrajen nov vodovod, dva nova odseka toplovoda na severnem kraku ulice, javna razsvetljava, rekonstrukcija vozišča med P1 in P24 ter nova semaforška krmlina naprava na križišču Cankarjeva-Rejčeva, ki omogoča vključitev semaforških glav še za pešce in kolesarje oz. za nov prometni režim, ki je predviden v križišču. Izvedba del je v teku oz. v zaključevanju. Komunalne naprave so zgrajene, posamezni odseki kolesarske poti so že asfaltirani. Prav tako je v grobem asfaltu izveden južni krak ulice.</p>	
8	07317	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	4.516.311,00 €	348.598,15 €	95,5%	<p>Na obravnavanih območjih, ki so predmet projekta odvajanje in čiščenje ni skladno s predpisi. Opremljenost aglomeracije z več kot 2.000 PE ne izpolnjuje zahtev veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Direktive o odpadnih vodah. Z izvedbo projekta bo aglomeracija Kromberk ID 1515 zagotavljala večjo priključenost na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji Operativnega programa odvajanje in čiščenja odpadnih voda RS se bodo realizirali v aglomeraciji ID Kromberk, ki bo priključena na ustrezno čiščenje na CČN Nova Gorica. Ukrep za doseganje tega specifičnega cilja je izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 4.642 m s 6 črpališči. V izvedbi je 9 od 12 odsekov, 3 odseki se pričenjajo.</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Izgradnja kanalizacije na območju posestive ulice - Ploščič obale 2. Izgradnja kanalizacije pri majhnem prelozju na Izpustni ulici v Novi Gorici 3. Izgradnja kanalizacije na ulici Barja v Novi Gorici 4. Izgradnja kanalizacije na Cesti 32, župnje v Novi Gorici 5. Fekalna kanalizacija na ulici Vinke Vodopivec od n. št. 204 do n. št. 100 6. Ureditev kanalizacije v osedi vasi Mlad Trnani v Kromberku 7. Gradnja ločnega kanalizacijskega omrežja odpadne vode na ulici Tomka Brnca v Kromberku 8. Kanalizacija na ulici Pod Štebarjem od n. št. 50 do n. št. 24 9. Izgradnja kanalizacije v zasebku Ščetine 10. Kanalizacija pri Višinski cesti od stanovanjskega objekta 39 do 45 11. Izgradnja kanalizacije na območju posestive nad Parkom centrom v Ščetinu 12. Fekalna kanalizacija na ulici Velika pot
9	07337	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	101.373,00 €	100.635,13 €	99,3%	<p>Revitalizacija obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti predstavlja pomemben korak k ponovnemu oživiljanju prostora med dvema državama, ki je bil dolga leta zaradi politične situacije zaprt. Istočasno obnovljena pot povezuje pomembne kulturno zgodovinske objekte z obeh strani meje in predstavlja atraktivno peš povezavo za občane obeh Goric.</p> <p>Revitalizacija obstoječe čezmejne peš povezave vključno z obstoječimi obeležji (kapelicami) od meje z Italijo do parkirišča ob cerkvi na Kostanjevici je zaključena. Postavljena je tudi urbana oprema.</p>	



INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR

Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
10	07346	Regulacija potoka Liskur	196.042,00 €	45.018,00 €	99,6%	<p>Glavni namen projekta je zagotovitev poplavne varnosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. Cilj je zagotoviti ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur ter ustrezno prometno dostopnost območja OPPN Rožna Dolina III. V letu 2022 je bil z DRSV podpisan sporazum s katerim se projekt uvršča v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga financira Evropska unija. Naročena je bila projektna dokumentacija IZP, DGD in PZR za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. V primeru, da se za predvidene ukrepe zagotavljanja poplavne varnosti pridobi gradbeno dovoljenje do marca 2024, bodo sredstva za pripravo projektna dokumentacije in nakupa zemljišč povrnjena.</p> <p>Pridobljeni so projektni pogoji, v izdelavi je katastrski elaborat in DGD projektna dokumentacija, izvedeni so bili pogovori s KS Rožna Dolina in lastniki zemljišč, na katere posegamo. Projektirana rešitev je povezana s spremembami in dopolnitvami OPN, ki bodo potrjene predvidoma v pričetku leta 2024.</p>	
11	07352	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	913.797,00 €	0,00 €	82,0%	<p>Glavni namen projekta je celovita ureditev avtobusnih postajališč mestnega prometa. V sklopu projekta je predvidena določitev enovite podobe in nekaj tipskih ureditev avtobusnih postajališč, izdelava projektna in druge potrebne dokumentacije za izvedbo projekta in celovita ureditev 25 avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice in Solkana. V Solkanu je predvidena tudi ureditev mini mobilnostnega huba.</p> <p>Cilj projekta je, da se s postopnim urejanjem avtobusnih postajališč, naredi mestni promet privlačnejši in dostopnejši za občane.</p> <p>V začetni fazi smo usklajevali številne detajle nadstrešnic in urbane opreme za vsako postajališče posebej. Teh je 25 ter usklajevali delo dobavitelja opreme in izvajalca GOI del. Temu vsled je večina postajališč usklajenih in potrjenih ter naročene nadstrešnice in večina urbane opreme. Izvajalec GOI del je začel z deli na postajališču v Solkanu (obračališče), na mobilnostnem HUBu ter na dveh postajališčih na Ulici Milojke Štrukelj. Lahko nastane težava pri pogodbenem roku, ker se dobavljena oprema izdeluje v Italiji, kjer imajo kolektivne dopuste. O bolj natančnih zamudah bomo vedeli ko Italijani pridejo z dopustov in bomo vedeli tudi točne dobavne roke. Trenutno je rok za dokončanje del 12.11.2023.</p>	
12	07366	Vodovod Mestna občina Nova Gorica	500.000,00 €	120.227,08 €	99,2%	<p>Predvideno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vodovod Ozeljan - prestavitev Vodovod Stara Gora - liskur - dokonkanje Vodovod Vitovlje - asfaltacija Vodovod Prvačina - asfaltacija Vodovod Preserje Hidrofor Nebotičnik Vodovod Ajševica krožišče - zaključek Vodovod Cankarjeva Lepenje armaturna celica Vodovod Breg - prestavitev vodovoda DN80, 440m Merilna mesta - DMA Vodovod Osek-pri pokopališču+navezava Osek - kloriranje-solarna naprava Vodovod Stara Gora - 20-15-17 2 -Erjavčeva; d63, l=85m 2- Kolodvorska; 65 + 750 4 - Barje 5 - Vodovod Vinka Vodopivca, DN100, 50m, d50, 30m 9 -Vodovod Ščedne; d63, l=200m 10 - Vodovod Vojkova; d63, L=130 11- Kajak (priključki) 12-Velika pot, d50,l=30m PD - vodovod Bate Sveto PD - Vodovod Stara Gora-Ajševica 	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR


Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
13	07367	Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica	192.507,00 €	56.591,76 €	99,5%	Predvideno: Kanalizacija Prvomajska Prvomajska ureditev pločnika - po izvedbi mešanega kanala DN600 Fekalna kanalizacija Ajševica Barje - kanalizacija + črpalnišče Žabji Kraj	
14	07368	Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica	134.300,00 €	38.101,28 €	95,2%	Predvideno: Kanalizacija Sp. Branica + asfaltacija Kanalizacija Osek Presejje – MK + Manjši odseki	
15	08024	Širitev sistema izposoje koles GO2GO	499.040,00 €	30.650,10 €	87,4%	Dela na objektu se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo. Vzpostavljenih je 11 od 13 postajališč, podaljšali rok izvedbe do 15.10.2023	
16	09082	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	1.648.299,00 €	1.015.011,75 €	64,4%	Objekt (izgradnje komunalne infrastrukture) je v fazi zaključevanja; v pripravi je končni uskladitveni aneks v vezi izvedbe del, v izdelavi je sprememba DGD/PZI dokumentacije za dopolnitev GD, ter PID za pridobitev UD. Pričakovani (finančni) zaključek operacije je 31.12.2023.	
17	10152	Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica	5.871.280,00 €	2.535.705,48 €	100,0%	Namen investicije je zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočili umestitev vseh potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, boljše prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva ter z izgradnjo garažne hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. Izvedba je v teku, izvajalec zamuja 6 tednov na terminski plan, zamudo bo skušal nadoknaditi. V letošnjem letu bo izpeljan postopek javnega naročila za izbor dobavitelja opreme. Načrt opreme je v pripravi in bo končan predvidoma septembra 2023.	 
18	10169	Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	139.876,00 €	68.614,20 €	81,6%	Dela na objektu so zaključena. Z nadzorom, predstavnikom investitorja in upravjalca se je pregledalo pomanjkljivosti po zaključeni dobi poskusnega obratovanja. Podalo se je seznam reklamacij, sledi predaja objekta v upravljanje.	
19	10179	Vrtec Grgar	372.218,00 €	372.217,81 €	100,0%	Objekt je zaključen. S strani predstavnika investitorja, nadzora, uporabnika in izvajalca se je opravilo pregled objekta ter izpostavilo napake. Napake na objektu bo izvajalec, v dogovoru z uporabnikom, odpravil predvidoma v mesecu septembru 2023. V dogovoru z uporabnikom sledi še zasaditev dreves.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR

Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
20	10205	URBINAT	153.989,00 €	45.086,53 €	29,9%	Sredstva so bila porabljena za izvedbo participacije v OŠ in vrtcih, organizacijo in izvedbo partnerskega sestanka ter za službena potovanja ter plačo. Ostala sredstva so predvidena za: - začetek vzpostavitve tematske poti ob potoku Koren (pripravljena je grafika tabel, vsebina za spletno stran, pridobljena soglasja MONG in DRSV) - pripravo projektne naloge, za pripravo projektne dokumentacije, na parcelah 1467/3,1468/3,1469/3,1467/4,1468/4,1469/4 za vodni teater in obnovitev mosta čez Ulico Šantlovih (v pripravi je pogodba za projektno nalogo) - izdelavo lokacijske preveritve za parcelo 1316 in 1315/1, zaradi uporabe prostora kot z namenom začasne rabe za rekreacijske površine (v pripravi je EN) - obnovo urbane opreme na območju poteka zdravega koridorja (v fazi analize potreb)	
21	10231	Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	476.450,00 €	475.992,03 €	99,9%	Objekt OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici je bil potreben celovite rekonstrukcije. Objekt se nahaja v degradiranem območju, zato se je poleg same rekonstrukcije in energetske sanacije izvedla tudi ureditev okolice in celotnega šolskega kareja. Izvedba del se je pričela v letu 2021 in se je zaključila v decembru 2022. V letu 2023 bodo sredstva porabljena za poplačilo obveznosti po končnem obračunu izvedenih del po pogodbi, ki vsebuje več in manj dela, dodatna dela in obračun podražitev.	
22	10232	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	2.235.089,00 €	2.167.272,03 €	99,1%	Objekt je zaključen; sledijo še aktivnosti na temo PR, uradna otvoritev oz. podobno.	
23	10254	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	189.315,00 €	1.308,08 €	84,1%	Sanacijska dela na Športni dvorani v Novi Gorici na osnovi unovčenja bančne garancije. Izveden je razpis za izbiro izvajalca, izbran je izvajalec del za vrednost 330.728,21 EUR, Mestna občina Nova Gorica bo izvedla plačilo v deležu 45,49%, dela naj bi bila izvedena do novembra 2023, kar je skladno s predvideno porabo proračunskih sredstev v tem letu.	
24	10263	EPK GOI2025 - infrastruktura	1.965.499,00 €	2.623,00 €	2,6%	V zaključni fazi je usklajevanje dogovora z RS in družbami SZ, kar je predpogoj za ureditev lastninskih in služnostnih pravic za načrtovane ukrepe na območju EPK district-a (podhod, EPIC, Super 8 in Trg Evrope). Za Trg Evrope se zaključuje pridobitev potrebne dokumentacije za rekonstrukcijo. Predviden izbor izvajalca za izvedbo je jan. 2024. Za ostale objekte je zaključen postopek izbire projektanta za pridobitev DGD-ja za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. Izbira izvajalca za izvedbo je načrtovana v začetku leta 2024. Do konca leta bodo načrtovana sredstva porabljana v celoti.	



INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR

Zap. št.	PP	Naziv proračunske postavke	Veljavni proračun na dan 5.9.2023	Realizacija na dan 5.9.2023	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
25	10265	Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	100.500,00 €	0,00 €	0,0%	<p>Osnovni namen projekta je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Kozara. Glavni cilj projekta je izvesti rekonstrukcijo obstoječe stavbe, učilnic in atrijev ter telovadnico OŠ Kozara, v prvi fazi se izvaja samo objekt telovadnice.</p> <p>Pridobljeno je sofinanciranje v višini 100.000,00 eur, potrebno je izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca, izvedba je predvidena v obdobju od novembra 2023 do marca 2024.</p>	
26	10271	Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza	155.500,00 €	10.760,40 €	100,0%	<p>V drugi fazi je predvidena rekonstrukcija dela objekta in izvedba prizidka OŠ Čepovan z umestitvijo nove kuhinje, jedilnice in pomožnih prostorov, vključno z dobavo in montažo opreme.</p> <p>Za izvedbo je bil izbran izvajalec ETG EDITREND Trgovina in gradbeništvo d.o.o. in sicer za dela v vrednosti 729.944,92 EUR z DDV. Uvedba v delo je predvidena v drugi polovici septembra 2023, zaključek del v juliju 2024, kar je skladno s predvideno porabo proračunskih sredstev v teh letih.</p>	
27	10267	Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca	100.000,00 €	0,00 €	0,0%	<p>Glavni razlog za izvedbo projekta je energetska in statična sanacija stavbe, sanacija glede ukrepov požarne varnosti ter funkcionalna prilagoditev obstoječih prostorov v smislu zadostitve pravilnikom in standardom ter obnova dotrajanih sklopov. Z izvedbo investicije bo izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne in električne energije in s tem tudi povečanje prihrankov ter zmanjševanje onesnaževanja okolja. Posledično bo omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev učencev. Prvi korak je pridobitev projektne dokumentacije, po pridobljeni dokumentaciji bo sledila izvedba.</p> <p>Objavljeno je javno naročilo za izbor projektanta, ki bo pripravil projektno dokumentacijo od idejne zasnove do projekta za izvedbo. Odpiranje ponudb bo 22. septembra 2023.</p>	
