

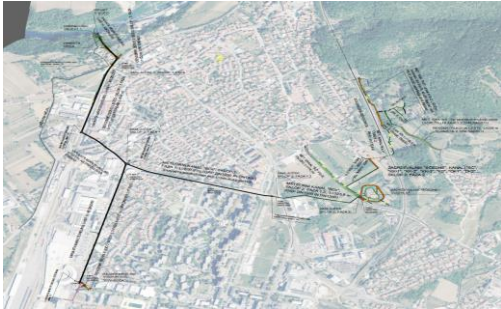
INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
INVESTICIJE PREDVIDENE ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOSTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR) - 100.000 EUR in več								
1	10263		EPK GOI2025 - infrastruktura					
		OB084-22-0006	EPK GOI2025 - Revitalizacija Trga Evrope	1.921.010,00	0,00	0,00%	Realizacije na postavki še ni. EZTS GO kljub zaključenim delom ni še izdal ustreznega zahtevka z vso potrebno dokumentacijo.	
		OB084-23-0078	EPK GOI2025 - EPIC	4.819.801,00	3.729.891,71	91,51%	GOI dela na objektu so zaključena, nameščena je bila tudi vsa predvidena oprema v sklopu objekta. Namešča se še oprema za potrebe muzejskega dela. Za objekt je bilo že pridobljeno uporabno dovoljenje, kar omogoča njegovo nemoteno uporabo. Do konca leta 2025 bodo v celoti doseženi osnovni namen in zastavljeni cilji projekta.	
		OB084-23-0079	EPK GOI2025 - SUPER 8	1.548.696,00	854.413,24	65,35%	GOI dela na objektu so zaključena, nameščena je bila tudi vsa predvidena oprema. Za objekt je bilo že pridobljeno uporabno dovoljenje, kar omogoča njegovo nemoteno uporabo. Do konca leta 2025 je predviden še odkup stavbe skupaj s pripadajočim zemljiščem, s čimer bodo v celoti doseženi osnovni namen in zastavljeni cilji projekta.	
2	07386		Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek					
		OB084-24-0090	Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek	611.150,00	0,00	0,00%	OPIS: Z investicijo v zamenjavo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema Mrzlek bodo občine (Kanal ob Soči, Brda, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba) v Goriški regiji izboljšale javno komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo. Investicija se uvršča med projekte občinske infrastrukture in vključuje tehnološko posodobitev vodovodnega omrežja, kar bo zmanjšalo vodne izgube, izboljšalo kakovost pitne vode ter povečalo dostopnost do javne oskrbe z vodo. STANJE: Izdelana je investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ in IP), dogovorjeno je, da bo občina Kanal ob Soči nosilec projekta, projekt Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek je bil s strani Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške) razvojne regije vključen v prvo dopolnitev Dogovora za razvoj Severno Primorske (Goriške) razvojne regije pod cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifični cilj RSO 2.5 Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev, in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je podalo Soglasje k uvrstitvi med/regijskih projektov v dogovor za razvoj regije: Specifični cilj RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri št. 35500-251/2024-2560-330 dne 14. 3. 2025.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2025 - 100.000 EUR in več								
3	06008	OB084-22-0013	Vzdrževanje objektov v lasti občine Vzdrževanje objekta "Nova KBM"	102.526,00	96.848,47	94,46%	Sredstva predmetne proračunske postavke so bila v prvih mesecih tekočega leta namenjena za zaključevanje del pri prenovi prostorov v objektu NOVA, pri čemer je bila izvedena tudi montaža stavbnega pohištva. Z zaključenimi deli se ustvarjajo pogoji za polno funkcionalnost objekta ter za doseganje zastavljenih ciljev investicije. V letu 2025 bo projekt zaključen v celoti, s čimer bodo uresničeni osnovni namen in vsi načrtovani cilji, ki so bili predvideni ob začetku investicije.	
4	07033	OB084-24-0003	Izvedba ukrepov za urejanje prometa Nakup opreme za urejanje in umirjanje prometa	138.307,00	58.157,11	79,01%	Kupljena in montirana je radarska oprema za merjenje prekoračitev hitrosti na petih lokacijah v mestu Nova Gorica (Solkan - AMD, Solkan - Sabotin, Nova Gorica - Gradnikove brigade pri lekarni, Erjavčeva ulica - Srednja ekonomska šola, Cankarjeva ulica - vrtec Ciciban). Z namestitvijo radarjev na prometno nevarna območja (šole, vrtci ...) želimo izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu.	
5	07054	OB084-23-0043	Kontejnerska mesta in ekološki otoki Ekološki otoki	140.000,00	61.589,12	65,75%	Projekt je v fazi izvajanja. V okviru predvidenega sta bila izvedena dva ekološka otoka in sicer na Rejčevi ulici v Novi Gorici ter ekološki otok ob cesti Lokve-Lazna v Krajevni skupnosti Lokve. V izdelavi je projektna dokumentacija PZI s popisi za dva ekološka otoka in sicer v Krajevni skupnosti Prvačina in Krajevni skupnosti Branik. Projekt je v fazi pridobivanja dokumentacije in soglasij. Opravljeni sta bili dve manjši popravili ekoloških otokov, predvidoma pa bodo izvedene še dve lokaciji, odvisno od višine prejetih ponudb za izvedo. V letu 2025 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi za tekoče leto. Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) zastavljeni za tekoče leto bodo realizirani do konca leta.	
6	07224	OB084-24-0088	Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki Ureditev požarne varnosti na zaprtem odlagališču	197.600,00	0,00	70,89%	Na zahtevo inšpektorja za požarno varnost se izvaja ureditev ploščadi za zeleni odrez, izvedeno je bilo javno naročilo in do konca leta bodo izvedena dela.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
7	07272	OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	189.800,00	111.020,25	90,11%	Pridobljena so tri gradbena dovoljenja za prve tri faze. Investitorstvo je prevzel DRSV. Gradnja prvih treh faz bo potekala po rumeni FIDIC knjigi, z načinom izvedbe mikrotuneliranja. Izveden je bil postopek javnega naročila (JN) za prve tri faze in izbran je izvajalec. Postopek izbire inženirja na strani DRSV je še v teku. V teku je JN za izbiro izvajalca za 4. in 5. fazo, ki bosta potekali po rdeči FIDIC knjigi.	
8	07286	OB084-23-0159	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Investicijsko vzdrževanje ČN 2025-2027	100.000,00	12.467,48	99,97%	V okviru predvidenega je bilo prvi polovici leta izvedena investicije v ČČN NOVA GORICA. V letu 2025 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi.	
9	07302	OB084-20-0020	Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek Magistralni vodovod DN 700	100.000,00	16.860,00	100,00%	»Rekonstrukcija magistralnega cevovoda DN 700 mm na odseku Žogica – Šolska ulica – do Žabje kraja.« Stanje projekta Priprava projektne dokumentacije DGD je v zaključni fazi. Dokumentacija bo kmalu oddana v postopek pridobivanja mnenj. Za popolno pripravo dokumentacije je potrebno še pridobiti eno parcelo.	
10	07350	OB084-24-0102	Operativni stroški priprave projektov Operativni stroški priprave projektov 2025-2029	130.000,00	39.346,43	69,52%	V okviru predvidenega je bilo prvi polovici leta izvedeno: - izvedbo postopka legalizacije objekta Grgar 34 - izdelava PZI načrta ureditev priključkov na javno cesto - PEC - dopolnilna PZI dokumentacija za projekt Kolesarska pot v Solkanskem športnem parku - umestitev zidov in zložb - priprava PID dokumentacija za projekt Kolesarska pot v Solkanskem športnem parku - umestitev zidov in zložb - izdelava projektne dokumentacije - zasaditveni načrt krožišč v Novi Gorici - pregled projektov in svetovanje v zvezi z dostopnostjo za funkcionalno ovirane osebe - načrt prometne ureditve - zapora cest - izdelava varnostnega načrta in izvajanje VZD - projekt ureditve neustreznega urejenega prehoda za kolesarje na lokalni cesti v Rožni Dolini - izvajanje nalog koordinacije z izdelavo varnostnega načrta za izvedbo obnove strehe v Lokovcu Ocenjuje se, da se bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabila v celoti.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
11	07357		Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	405.000,00	0,00	0,00%	Za omenjeni projekt je bila pripravljena projektna naloga ter naročena izdelava dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP). Po pridobitvi mnenj pristojnih mnenjedajalcev bo mogoče natančneje opredeliti tudi predvideno višino investicijske vrednosti. Sredstva, zagotovljena na proračunski postavki, do konca leta ne bodo v celoti porabljena, temveč bodo ostala delno neizkoriščena in se bodo prenesla v naslednje obdobje, ko bodo izvedeni nadaljnji koraki projekta.	
12	07366		Vodovod Mestna občina Nova Gorica KS Nova Gorica - javni vodovod	148.718,00	0,00	97,07%	Namen je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Nova Gorica. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnega sistema. V sklopu Aglomeracije v letu 2025 se je uredilo naslednje vodovodne odseke: - Obnova JV v Ulici Pod Gričem. - Prestavitev oz. izgradnja novega Hidroforja ob Kostanjeviški cesti - Rafut. -2025 je naročeno večjo število projektne dokumentacije za odseke po NG.	
		OB084-23-0063	KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod	110.000,00	0,00	100,00%	Namen je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Ozeljan - Šmihel. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje načrtuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov. V 2025 je v izdelavi projektna dokumentacija. Na novo je izgrajen JV v Šmihelu - odsek do 47,48.	
13	07367		Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Kanalizacija Gradišče	1.000.000,00	0,00	83,89%	V letu 2025 bodo osnovni namen in cilji projekta deloma doseženi. Osnovni namen projekta je izvedba novega kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti novo kanalizacijsko omrežje v naselju ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih in meteornih vod na obravnavanem območju. V letu 2025 je bil izbran izvajalec, ki je z deli pričel v aprilu mesecu in jih bo nadaljeval tudi v letu 2026 ko je predviden zaključek projekta. Glede na dosedanji potek del se ocenjuje, da bo projekt izgradnje fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino v letu 2026 uspešno realiziran.	 

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
		OB084-23-0024	KS Nova Gorica - javna kanalizacija	420.000,00	4.196,80	39,20%	Namen je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Nova Gorica. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje dograjuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov s končnim iztokom na KČN Nova Gorica. V 2025 je zgrajeno: Kanalizacija na Kostonjeviški - Rafut, manjši fekalni odseki. Določeni projekti pridobitve projektne dokumentacije, ki so že naročeni letos, bodo v izdelavi še v naslednjem letu.	
14	07368	OB084-23-0024	Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica KS Nova Gorica - javna kanalizacija	115.000,00	7.070,06	93,64%	V letu 2025 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. Namen projekta je nadaljevanje izgradnje meteorne kanalizacije na območju KS Nova Gorica. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se omrežje dograjuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote. V 2025 je zgrajen odsek meteorne na Kostonjeviški - Rafut, manjši odsek.	
15	07370	OB084-23-0034	Trajnostno urejanje prometa Trajnostno urejanje prometa	222.000,00	83.793,81	88,09%	Namen je izdelava projektne dokumentacije in strokovnih podlag za urejanje prometa na območju Mestne občine Nova Gorica. V okviru predvidenega je bilo v prvi polovici leta realizirano: Izdelava Občinske celostne prometne strategije (del), projektna dokumentacija za ureditev Kostonjeviške ceste ob vhodu v Rafutski park z začasnim avtobusnim postajališčem, projektna dokumentacija IZP za preusmeritev regionalne ceste na Lokvah, Projektna dokumentacija za ureditev avtobusnih postajališč v Braniku (del). Ocenjuje se, da se bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabila v celoti.	
16	07377	OB084-23-0144	Rekonstrukcija cestnega omrežja Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	690.000,00	574.162,97	91,98%	V okviru predvidenega je bilo prvi polovici leta izvedeno: - sanacija dela LG 287031 ul. Tolminskih Puntarjev in LC 288101 Kidričeve ulice - preplastitev LC 284122 Loke – Pod gradom – Kromberk - asfaltacija Kolodvorske poti med Trgom Evrope in Super 8 - ureditev neustrezno urejenega prehoda za kolesarje na lokalni cesti 287171 ob rondoju Rožna Dolina - ureditev pešpoti in kolesarske steze med Prvomajsko ulico in ŽP Nova Gorica - izvedba del za postavitev označevalnih tabel za potrebe EPK 2025 - ureditev in sanacija cest v Novi Gorici za potrebe Gira d'Italia Ocenjuje se, da se bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabila v celoti.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
17	07382		Postavitev sončnih elektrarn konzorcij MONC					
		OB084-24-0009	Postavitev sončne elektrarne na objektu Stadion Nova Gorica	213.671,00	0,00	79,91%	Podpisana je bila pogodba z izvajalcem, predvidena je postavitev sončne elektrarne do sredine oktobra.	
		OB084-24-0014	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Branik	183.477,00	0,00	78,96%	Podpisana je bila pogodba z izvajalcem, predvidena je postavitev sončne elektrarne do sredine oktobra.	
		OB084-24-0015	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Solkan	168.930,00	0,00	79,40%	Podpisana je bila pogodba z izvajalcem, predvidena je postavitev sončne elektrarne do sredine oktobra.	
		OB084-24-0016	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Šempas	113.246,00	0,00	77,25%	Podpisana je bila pogodba z izvajalcem, predvidena je postavitev sončne elektrarne do sredine oktobra.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
		OB084-24-0017	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Frana Erjavca	143.609,00	0,00	78,93%	Podpisana je bila pogodba z izvajalcem, predvidena je postavitev sončne elektrarne do sredine oktobra.	
		OB084-24-0021	Postavitev sončnih elektrarn pri konzorcijskih partnerjih Občini Brda, DUNG in ŠC NG	616.494,00	0,00	0,00%	V NRP projektu so zajete vrednosti postavitve sončnih elektrarn za Občino Brda, Šolski center Nova Gorica in Dom upokoencev Nova Gorica	
18	07390		Obnova Spominskega parka in vojnega grobišča Trnovo nad Novo Gorico					
		OB084-24-0100	Obnova Spominskega parka in vojnega grobišča Trnovo nad Novo Gorico	173.500,00	1.790,00	1,03%	Izdelana je bila dokumentacija in pridobljeno soglasje ZzVKDS. Sklenjen je bil sporazum o financiranju izvedbe sanacije dotrajanih pohodnih kamnitih površin, zidov, napisnih plošč, spomenika - obeliska in grobnice v spominskem parku NOB na Trnovem nad Novo Gorico. Trenutno je v teku ponovljen razpis za izvedbo obrtniško konservatorskih del, s tem v zvezi je bil sklenjen tudi aneks št. 1. k sporazumu o zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za izvedbo v višini 60.000,00EUR.	
19	07391		Urejanje poslovnih con					
		OB084-24-0101	Urejanje poslovnih con	100.000,00	0,00	0,00%	Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za izvedbo ukrepov na rezervoarju požarnih vod, ki so bili potrebni na podlagi pripomb in zahtev upravitelja omrežja pred primopredajo objekta. Objavljen je bil razpis za izvedbo nasipov in priključkov na območju Poslovno ekonomske cone Kromberk. Prejete ponudbe so presegle razpoložljiva sredstva, zato je bilo potrebno okrniti izvedbo del ter razpis ponoviti. V sredini avgusta 2025 bo razpis zaključen. V kolikor bo razpis uspešen, se bo z deli pričelo v septembru 2025 ter zaključilo v prvi četrtini prihodnjega leta.	
20	08027		Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija					
		OB084-23-0033	Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija	155.000,00	43.824,16	95,49%	Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za strokovne podlage: Analiza gospodarskega podpornega okolja MONG, Analiza ključnih gospodarskih sektorjev MONG, Izdelava zazidalnega preizkusa in projektne naloge za arhitekturni natečaj OB SODIŠČU KARE A in Geotehnično poročilo za postopek SD7 OPN.	
		OB084-23-0153	OPPN poslovna cona Meblo	134.500,00	34.404,00	74,35%	Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo geodetskega načrta, ki predstavlja osnovo za nadaljnje faze pri projektu. V septembru je predvidena seznanitev deležnikov v poslovni coni Meblo s pripravljenimi strokovnimi podlagami in izdelava osnutka OPPN poslovna cona Meblo za prva mnenja nosilcev urejanja prostora.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
21	<u>09076</u>	<u>OB084-23-0103</u>	<u>Sredstva iz koncesnine državnih gozdov</u> <u>Investicijsko vzdrževanje gozdnih in</u> <u>občinskih cest 2024-2028</u>	230.000,00	157.128,97	68,32%	Sredstva iz te postavke so del koncesnine, ki jo upravljalet državnih gozdov plačuje državi za posekan les v državnih gozdovih. Del sredstev iz te proračunske postavke porabimo za vzdrževanje gozdnih cest in lokalnih poti, ki so bolj obremenjene zaradi povečanega odvoza lesa, del ga porabimo za vzdrževanje in gradnjo proti požarnih presek, del pa za vzdrževanje poljskih poti, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica. V pripravi je seznam potrebnih popravil, sredstva pa bodo porabljena do konca leta. V okviru predvidenega so bila sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta porabljena za preplastitev in ureditev JP 784031 Konče – Odpade. Ocenjuje se, da se bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabila v celoti.	
22	<u>09097</u>	<u>OB084-23-0072</u>	<u>Zeleni vstopni center Lijak</u> <u>Zeleni vstopni center v turistično</u> <u>varovano območje Lijak</u>	810.563,00	492.193,03	80,41%	Sredstva so bila namenjena za izvedbo GOI del na objektu ZVC Lijak. Gradnja objekta se nahaja v zaključni fazi, pri čemer se ocenjuje, da bodo razpoložljiva sredstva na predmetni proračunski postavki porabljena v celoti do konca letošnjega leta.	
23	<u>09099</u>	<u>OB084-24-0001</u>	<u>Vzdrževanje protipožarnih presek</u> <u>Vzdrževanje in gradnja protipožarne</u> <u>infrastrukture</u>	213.249,00	167.670,16	79,32%	Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za ureditev cca. 1.300 m protipožarne poti v k.o. Čepovan, za ureditev 4-ih odjemnih mest za odvzem vode - hidrantov (2 x v Čepovanu, 1 x pod Škabrijelom Fajdigovšče in 1 x Šmihel) in za vzdrževanje več protipožarnih poti na območju Krasa in Trnovsko-Banjske planote. Mestna občina Nova Gorica je vse te ureditve uspešno zaključila in tudi pridobila sredstva iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za namen preprečevanja škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Do konca leta imamo v planu še izvesti vzdrževanje drugih protipožarnih poti.	
24	<u>09102</u>	<u>OB084-24-0002</u>	<u>Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih</u> <u>tehnologij na območju Science City</u> <u>Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih</u> <u>tehnologij na območju Science City</u>	1.441.425,00	0,00	0,00%	Sredstva na proračunski postavki so v letu 2025 namenjena pripravi projektne in druge dokumentacije za izvedbo prijav na morebitne razpise pristojnih ministrstev oziroma za morebitno novo izvedbo poziva za pridobitev zasebnega partnerja. V prvi polovici leta nov razpis ni bil objavljen. Sredstva na proračunski postavki ostajajo neizkoriščena. Poraba sredstev je odvisna od državnih/evropskih virov.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
25	10052	OB084-23-0140	<u>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</u> Ureditev športnega igrišča Branik	710.397,00	222.720,86	89,20%	Projekt ureditve igrišča in parkirišča se približuje koncu. Polaga se zaključna plast gume, sledi zarisovanje črt in montaža športne opreme. Sledi kvalitativni pregled, primopredaja, pridobitev uporabnega dovoljenja ter predaja objekta v uporabo. Predvideva se, da bo z novim šolskim letom, septembra 2025, igrišče lahko predano v uporabo. S projektom smo pridobili približno 2.300 m² športnih površin, ki zajemajo nogometno igrišče, igrišče za odbojko, košarkarsko igrišče, tekalno stezo in zaletišče za skok v daljino ter otroška igrala, učilnico na prostem, sadovnjak in šolski vrt. Ob obstoječi javni poti, ki se jo je razširilo in dogradilo s pločnikom, je na novo urejenih 19 parkirnih mest. Investicija je predvsem pomembna, ker je z izvedbo urejena kvalitetna in varna športna infrastruktura z drugimi površinami za izvajanje športne vzgoje in drugih izobraževalnih programov za otroke in mladino, ter kvalitetnega preživljanja prostega časa krajanov in mladih. Projekt prispeva k urejenemu izgledu šolskega okoliša in naselja Branik. Končna vrednost investicijskega projekta bo znana ob zaključku del in izdaji končnega obračuna. Skladno z investicijsko dokumentacijo le-ta znaša 1.270.176 EUR. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, v višini 500.000 EUR.	  
26	10152	OB084-20-0003	<u>Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica</u> Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	3.230.396,00	2.270.487,83	75,86%	Investicija je zaključena, objekt je bil predan uporabniku. Odpravljajo se napake v času trajanja garancijske dobe, ki jih uporabnika in naročnik zaznavata. Z investicijskim projektom smo pridobili nove površine za primarno zdravstveno dejavnost, ki omogočajo umestitev vseh potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, boljšo prostorsko organizacijo programov in poenotenje vseh dejavnosti na eni lokaciji. Pridobili smo tudi dvonadstropno garažno hišo z 237 parkirnimi mesti in zunanje površine, namenjene parkovni ureditvi za kvalitetno izkoriščen javni prostor.	
27	10158	OB084-20-0005	<u>Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza</u> Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	219.806,00	13.805,52	99,98%	Izbran je bil izvajalec del GITRI d.o.o., ki je z deli pričel v juniju 2025, zaključek del je predviden v januarju 2026. Investicija obsega energetsko sanacijo objekta z zamenjavo strehe, stavbnega pohištva in fasade, izvedbo funkcionalne povezave z novim delom ter celovito obnovo sanitarij.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
28	10206		<u>Ureditev Rafutskega parka z Laščakovim vilo</u>					
		OB084-22-0003	Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917)	189.706,00	0,00	18,35%	Projekt obnove vile je zelo kompleksen, predvsem zaradi umeščanja potrebnih parkirišč, ki so nujna za pridobitev GD. V obravnavi je celoten park z vilo, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno poplavno varnost in zahtevana parkirišča za katera je razpoložljivega prostora zelo malo. Naročilo projektne dokumentacije za obnovo Laščakove vile bo izvedeno v 2. polovici leta 2025, zaradi vsebinsko-tehnične povezanosti s projektiranjem druge faze obnove Rafutskega parka, vključno z vsemi stavbami, ki v parku stojijo poleg Laščakove vile. Pridobivanje gradbenega dovoljenja za obnovo vile je predvideno v prvi polovici leta 2026.	
		OB084-24-0092	Rafutski park - laboratorij sonaravnih praks	131.200,00	0,00	1,03%	Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacij v okviru katere se bo skozi programsko in prostorsko preveritev zasnovala celovita prenova Rafutskega parka u skladu z razvojnimi cilji, ki so poleg usmeritev iz naslova obstoječih varovanj naravnega in kulturnega spomenika še: zagotovitev potrebnih vsebin za certificiranje parka, nadgradnja varovanja kulturnega spomenika, razvoj parka kot območje za promocijo izboljšanja biotske raznovrstnosti, ... Obravnava parka kot celote je ključnega pomena in predpogoj za obnovo vile. Zagotovilo se bo ustrezno infrastrukturo (zadrževalnik, parkirišče, ...), ki so predpogoj za pridobitev GD za obnovo vile.	
29	10219		<u>Sanacija letnega bazena</u>					
		OB084-19-0017	Sanacija letnega bazena	2.215.711,00	395.739,30	96,04%	Izbran je bil izvajalec GOI del za rekonstrukcijo Letnega bazena v Novi Gorici. Rok za izvedbo del je bil predviden 25.7.2025, vendar se odmika predvidoma za dva meseca. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti.	
30	10263		<u>EPK GOI2025 - infrastruktura</u>					
		OB084-23-0080	EPK GOI2025 - Kolesarska in peš povezava v okviru nadgradnje ŽPI ŽP Nova Gorica	808.199,00	541.692,94	99,07%	Projekt je v fazi zaključevanja. Projektiranje in samo investicijo so vodile Slovenske železnice v okviru prenove železniške postaje Nova Gorica na podlagi sklenjenega sporazuma med vsemi udeleženci. Izvedba del je v zaključevanju (predvsem vezana na zunanjo ureditev vrtače). Zaključek projekta je bi v prvi polovici leta 2025, finančni zaključek pa do konca leta 2025, ko bodo doseženi vsi cilji in kazalniki projekta. Osnovni namen in cilji projekta bodo doseženi v letu 2025 skladno s planom.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
		OB084-23-0096	EPK GO!2025 - Igrišča na meji	403.163,00	35.294,60	81,75%	Projekt je v fazi izvedbe. Trenutno poteka asfaltacija igrišča in ureditev brežin. Sledilo bo polaganje končnega tlaka igrišča s ploščami, montaža košev ter ureditev okolice. Investicija bo predvidoma zaključena konec avgusta 2025. Končna vrednost investicijskega projekta bo znana ob zaključku del in izdaji končnega obračuna. Skladno z investicijsko dokumentacijo le-ta znaša 403.163 EUR . Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, v višini 100.000 EUR ter s strani Fundacije Gorana Dragiča - Ustanova za pomoč otrokom in mladini v višini 15.000 EUR.	
		OB084-23-0097	EPK GO!2025 - Trg Evrope - Lott 2	272.030,00	25.182,35	12,47%	Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo končne situacije izvedene meteorne kanalizacije, nadzora nad gradnjo, za novelacijo geodetskega posnetka ter za izdelavo idejne zasnove in ureditve območja Kolodvorske poti. Preostala sredstva so namenjena urejanju območja med Trgom EU in Erjavčevo ulico skupaj z Občino Gorica, ki bo urejala območje na IT strani. Projektna dokumentacija je pripravljena, predviden začetek je v 4. kvartalu leta 2025.	
31	10272		Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan					
		OB084-23-0038	Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan	402.085,00	244.732,64	100,56%	Za predmetni projekt je bila izdelana projektna dokumentacija, ki predstavlja osnovo za nadaljnje za izvedbo. Trenutno so v teku gradbeno-obrtniška dela, in sicer sanacija strehe na starem delu objekta ter rekonstrukcija petih učilnic. Z izvedbo teh posegov se bodo zagotovili boljši prostorski in tehnični pogoji za izvajanje pouka ter hkrati izboljšala energetska učinkovitost in funkcionalnost objekta.	
32	10275		Projekt SINGERS CORNERS					
		OB084-23-0089	Projekt SINGERS CORNERS	272.184,00	72.318,34	73,42%	Aktivnosti na projektu so se skladno s prijavnico pričele izvajati 01.01.2024 in bodo zaključene 01.01.2026. V sklopu projekta je bila izdelana celostna grafična podoba, izveden je bil prvi dogodek v sklopu projekta - glasbeni dogodek v vasi Tabor. Naročena je bila oprema v podporo izvedbi dogodkov (oprema za osvetlitev). V prvem polletju 2025 so bila sredstva porabljena za izvedbo dogodkov v sklopu razpršenega festivala zborovskega petja na prostem, izvedbo pogostitve v okviru srečanja projektnih partnerjev ter delno izvedbo ureditve Potarjeve hiše v vasi Tabor nad Domberkom. Do konca leta bodo razpoložljiva sredstva porabljena v celoti in bo skladno s časovnico projekt zaključen.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1 na dan 30.6.2025	Realizacija na dan 30.6.2025	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
33	<u>10280</u>		<u>Dom vseh generacij Solkan</u> OB084-25-0001 Dom vseh generacij Solkan	1.052.060,00	1.383,08	0,21%	Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za nakup objekta in parcele "Vino gorica", v okviru katerih naj bi se uredilo "Dom vseh generacij Solkan" ter za pripravo projektne in druge dokumentacije za pripravo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na PT ZMOS (1. faza) in PT MNVP (2. faza). Proračunska postavka s pripadajočim NRP je bila odprta v okviru rebalansa proračuna, saj je predvidena prijava projekta "Dom vseh generacij Solkan" na morebitna dodatna sredstva v okviru mehanizma CTN, PN9: Trajnostni razvoj lokalnih območij, specifičnega cilja RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR). Prijava ni bila uspešna. Sredstva bodo do konca leta porabljena le delno za pripravo strokovnih podlag in potrebne projektne dokumentacije za morebiten nov razpis v letu 2026.	
