ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt MIC GORIŠKA REGIJA

POROČILO

Nova Gorica **Oktober 2013**

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.

1. UVOD
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVA GORICA/MIC

Povratek na pot stabilne gospodarske rasti bo mogoče doseči le, če bo znanje pametno izkoriščeno, saj so ravno znanje, veščine in kompetence ljudi tisti ključni dejavniki, ki omogočajo, da se raziskovalni, razvojni in tržni potenciali lahko izkoristijo in prispevajo k povečevanju produktivnosti in inovativnosti. Ponudba znanja mora biti usklajena z razvojnimi potrebami trga delovne sile.

Eden izmed najpomembnejših akterjev na področju znanja na poti k ponovni gospodarski rasti v Novi Gorici je tudi Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica, in je trenutno eden izmed najpomembnejših razvojnih projektov na Goriškem.

- MIC ne pomeni le učnih delavnic in izvajanje praktičnega pouka v šoli, ampak je sodobni izobraževalni center z različnimi dejavnostmi, namenjen različnim ciljnim skupinam in naravnan na udejanjanje vseživljenjskega učenja v praksi.
- Na MIC-u so specializirane učilnice, delavnice, laboratoriji in večnamenski prostori za izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja iz različnih področij, kjer dobro usposobljeni (teoretično in praktično) učitelji, predavatelji, inštruktorji in trenerji opravljajo svoje strokovno delo.
- Pridobivanje novih uporabnih znanj na najsodobnejši opremi. V sodelovanju z gospodarstvom MIC omogoča dijakom, študentom, zaposlenim in brezposelnim, obrtnikom, podjetjem pridobivanje specifičnih strokovnih znanj na najsodobnejši opremi, tako da so udeleženci izobraževanj z novo pridobljenimi znanji na trgu dela oz. na delovnem mestu še bolj učinkoviti.
- Ključni produkt: "kakovostni kadri" za konkretna delovna mesta (MIC pomeni podporo konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu).
- V Sloveniji je trenutno 19 MIC-ev (Slika 1: MIC-i v Sloveniji).

NAMEN MICa:

- podporno okolje za razvoj konkurenčnosti gospodarskih subjektov
- gibalo inovativnosti in tehnološkega razvoja v lokalnem in širšem slovenskem kot tudi mednarodnem okolju

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.

GLAVNI CILJI MICa:

- povezovanje šolstva z gospodarstvom in obrtjo z namenom skupnega ustvarjanja kvalitetnih kadrov na mednarodno primerljivi ravni, preprečevanja brezposelnosti in ohranjanja ter pridobivanja novih delovnih mest
- Promocija in krepitev ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti kot vrednote na vseh stopnjah izobraževanja –vseživljenjsko učenje
- izvajanje usposabljanja in izobraževanja ter vseživljenjskega učenja s poudarkom na pridobivanju praktičnih znanj glede na potrebe trga dela (pridobivanje aktualnih strokovnih znanj, vezanih na sodobne tehnologije v podjetjih, spremljanje razvoja tehnologije in izvajanje strokovnih usposabljanj, prekvalifikacij v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij
- nudenje optimalnih pogojev za usposabljanje strokovne delovne sile na podlagi mase znanja, strokovnih kompetenc in tehnološke opremljenosti.

AKTIVNOSTI MIC:

Na letnem nivoju izobrazimo približno 700 odraslih oseb, z letošnjim letom pa smo začeli z intenzivnim usposabljanjem brezposelnih, tako da bomo na letnem nivoju izobrazili in usposobili približno 1000 odraslih oseb. Predvsem govorimo tu o formalnih programih, ki omogočajo pridobitev izobrazbe ter o praktično naravnanih usposabljanjih, ki odraslim omogočajo hitro prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za hitrejšo zaposlitev. To so usposabljanja na področju: strojništva, lesarstva, obnovljivih virov energije, zdravstva, kmetijstva, gostinstva, elektrotehnike, računalništva, podjetništva.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.

Vsa večja slovenska mesta že imajo novo zgrajene in sodobno opremljene MICe. Nova Gorica ne sme zaostajati. MIC Nova Gorica sicer deluje že od leta 2007, vendar razpolaga z neustreznimi infrastrukturnimi pogoji.

MIC je sicer deloval že od leta 2004, formalno pa je bil ustanovljen leta 2007.

MIC - INVESTICIJA

2. Vrednost projekta

	Vrednost investicijskega projekta
Neto vrednost investicijskega projekta (EUR brez DDV)	**2.849.332,47 EUR**
DDV	*565.018,10 EUR*
Bruto vrednost investicijskega projekta (EUR z DDV)	**3.414.350,57 EUR**

Viri financiranja: 2.500.000,00 eur – evropska sredstva
640.000,00 eur – lokalni viri (občine)

3. Realizirane aktivnosti v obdobju 2010 - 2013

	Aktivnosti	termin	opombe
1.	Izvedba arhitekturnega natečaja	Februar – junij 2010	
2.	Priprava projektne dokumentacije	Julij 2010– januar 2011	
3.	javno naročilo po odprtem postopku na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju za izbiro izvajalca za rušitvena in gradbena dela ter zunanjo ureditev	Februar 2011 Julij 2011	Zaradi težav z izvajalcem, Primorje d.d., ki je bil izbran za izvedbo na javnem razpisu 2011, in je v letu 2012 šel v stečaj, smo ponovili Izvedbo JN
4.	Izbor izvajalca za strojne in elektroinštalacije	Januar 2012	Dulc d.o.o. (strojne), Salinvest d.o.o. (elektro)
5.	Prekinitev pogodbe s Primorjem d.d.	Februar 2012 April 2012	Zaradi stečaja Primorja smo morali prekiniti pogodbo z njimi

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.

6.	Ponovitev razpisa za gradbeni del in zunanjo ureditev	Junij 2012	
7.	Pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo MIC-Goriška regija	april – junij 2012	
8.	Podpis pogodbe z novim izvajalcem za rušitvena in gradbena dela ter zunanjo ureditev Makro 5	april – junij 2012	
9.	Izdelava projektov PZI		
10.	Oddana prošnja za podaljšanje projekta ter za spremembo projekta zaradi finančnih vzrokov in stečaja Primorja na MIZŠ in MGRT		zaradi omenjenih težav s Primorjem smo zaprosili za podaljšanje projekta
11.	Odobritev podaljšanja projekta na 15.9.2014	Junij 2012	
12.	Pridobljeno soglasje za spremembo projekta	September 2012	
13.	Pričetek gradnje	19.6.2012	
14.	Ponovitev razpisa za obrtniška dela	Februar 2013	Izbrani izvajalec- VG5 d.o.o.

Predvideni zaključek investicije I. faze februar 2014 (vključno z uporabnim dovoljenjem).

4. Potrebe po dodatnih sredstvih

	Vrednost investicijskega projekta
Neto vrednost investicijskega projekta (EUR brez DDV)	**2.849.332,47 EUR**
DDV	*565.018,10 EUR*
Bruto vrednost investicijskega projekta (EUR z DDV)	**3.414.350,57 EUR**

Viri financiranja: 2.500.000,00 eur – evropska sredstva
640.000,00 eur – lokalni viri (občine)

Ko smo konec leta 2009 pridobili projekt MIC-Goriška regija, smo imeli kot del projektne dokumentacije le idejno rešitev investicije MIC. Januarja 2010 smo podpisali pogodbo z MIZŠ za evropska sredstva ter pričeli s projektom. Projekt je potekal kot vidite v zgornji tabeli. Kmalu po začetku projekta se je gospodarska kriza dotaknila tudi naše investicije. Namreč, tekom projekta so zaradi gospodarske krize podjetja odstopila od sofinanciranja, prav tako tudi nekatere občine.

Primanjkuje nam 380.000,00 eur za dokončanje investicije, ki jo končujemo februarja 2014. 274.000,00 eur nam primanjkuje zaradi izpada nekaterih sofinancerjev (podjetja, občine), dodatnih 106.000,00 eur stroškov pa je prav tako nastalo zaradi gospodarske krize, kar je imelo za posledice ponavljanje razpisov, podaljšanje projekta,…
S temi podatki smo MONG seznanili že pred kakim letom.

5. Slikovno gradivo

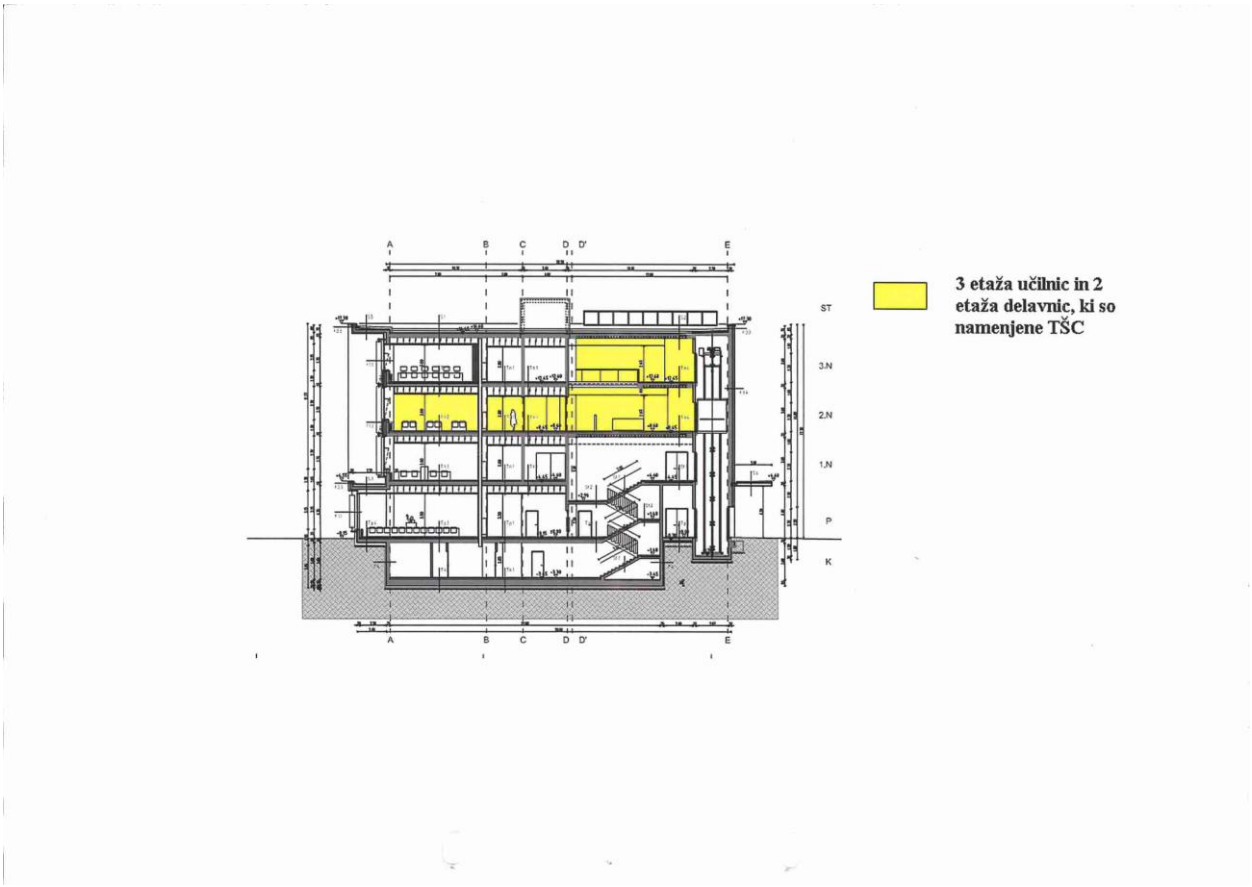

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.

Poročilo pripravila:
Adrijana Hodak, vodja MIC Nova Gorica

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura.
